T. TRANQUILO.

A máquina dos *80 eventos*

Plano de implementação para os próximos dois meses: processos funcionando, área do franqueado no ar e o time desafogado.

> Ouvidos atentos. Corações abertos.

Área do franqueado — FRENTE 1

Envios do Bruno — FRENTE 2

Automatizar o resto — FRENTE 3

O QUE VOCÊ ME PEDIU

Fazer os processos existirem e rodarem sozinhos, para um time curtíssimo entregar de 50 a 80 eventos sem crescer.

A partir do seu áudio

AGORA · PRÓXIMOS 2 MESES

Implementar a máquina

Área do franqueado funcionando, envios do Bruno automatizados e tudo o que der para automatizar. Menos análise, mais coisa rodando.

DEPOIS · OUTRA FASE

De 80 para 160

Olhar os números, a curadoria e a estratégia de crescimento. Só depois que a máquina provar que funciona.

A PROVA QUE VAMOS BUSCAR

O mesmo time, *mais eventos*

Em 8 semanas, mostrar com números que o time atual aguenta a escala de 50 a 80 eventos, porque o trabalho manual saiu do caminho.

Horas manuais por evento

Quanto do time central cada evento ainda consome

Pedidos ao Bruno por evento

Briefings, materiais e dúvidas que chegam individualmente

Tempo para a praça preparar um evento

Do evento confirmado ao plano pronto

Tarefas feitas sem acionar o centro

Autonomia real do franqueado

Na semana 1 eu meço o ponto de partida. Sem isso, não dá para provar nada no fim.

ONDE CONCENTRAR

Três frentes, nessa ordem

1

Área do franqueado no ar

O método, as tarefas, os playbooks e os materiais num lugar só, com o conteúdo real do Notion. O franqueado prepara o evento sem pedir tudo por mensagem.

PROTÓTIPO JÁ PRONTO

2

Envios do Bruno no automático

Os relatórios e briefings que hoje ele monta um a um saem sozinhos, a partir dos dados do evento. O Bruno revisa as exceções, não refaz tudo.


MAPEAR NA SEMANA 1

3

Automatizar o resto que der

Uma fila de rotinas manuais, atacada pela ordem de horas economizadas, aproveitando as ferramentas que vocês já pagam.

FILA POR RETORNO

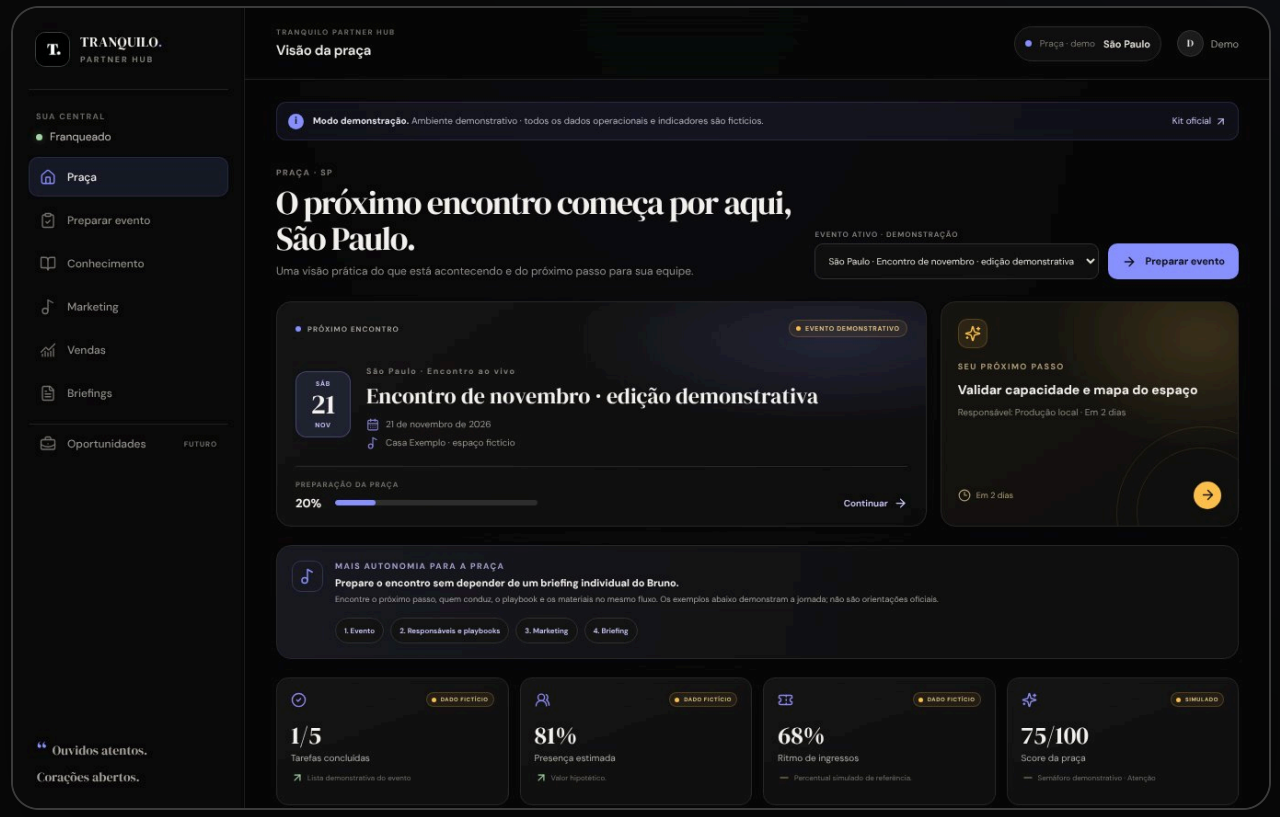

Ela já tem cara. Agora precisa de dado real

O protótipo mostra a jornada: evento → responsáveis → playbooks → marketing → briefing. Hoje roda com dados fictícios.

PARA VIRAR REAL

- Puxar playbooks e checklists do Notion
- Acesso separado por praça
- Tarefas e prazos reais de cada evento
- Piloto com uma praça antes de abrir para todas

Abrir o protótipo →

Tirar o Bruno do papel de *despachante*

HOJE	**Praça pede** por mensagem	→ **Bruno junta** dados, materiais e prazos	→ **Monta um a um** relatório ou briefing	→ **Envia** e responde dúvidas
DEPOIS	**Evento cadastrado** uma vez, no lugar certo	→ **Sistema monta** o pacote com dados e materiais	→ **Envio automático** na data combinada	→ **Bruno revisa** só as exceções

SEMANA 1

Sento com o Bruno para listar cada envio: o que é, para quem, de onde vêm os dados e quanto tempo toma. O desenho final sai desse mapa.


Uma fila, atacada pelo que mais devolve tempo

	ROTINA	COMO ESTÁ HOJE	PRIMEIRO PASSO
a	**Importação da bilheteria**	Funciona, mas a alimentação é manual	Rotina agendada sem digitação
b	**Fechamento por evento**	Modelo em planilha, fontes que não batem	Prestação de contas padrão da praça
c	**Atendimento no WhatsApp**	Automação planejada, testes pendentes	Respostas de agenda por cidade
d	**Contratos**	Há automação parcial, a verificar	Gerar a partir do evento cadastrado
e	**Alertas de vendas**	Não existe	Aviso quando a venda está abaixo do esperado

Ordem a confirmar na semana 1, pelas horas que cada rotina toma hoje. Estado atual segundo o briefing de Inteligência & Dados. Prioridade é reaproveitar Notion, Zapier, NextTags e o que já existe.

OS DOIS MESES

Oito semanas, com coisa nova rodando toda semana

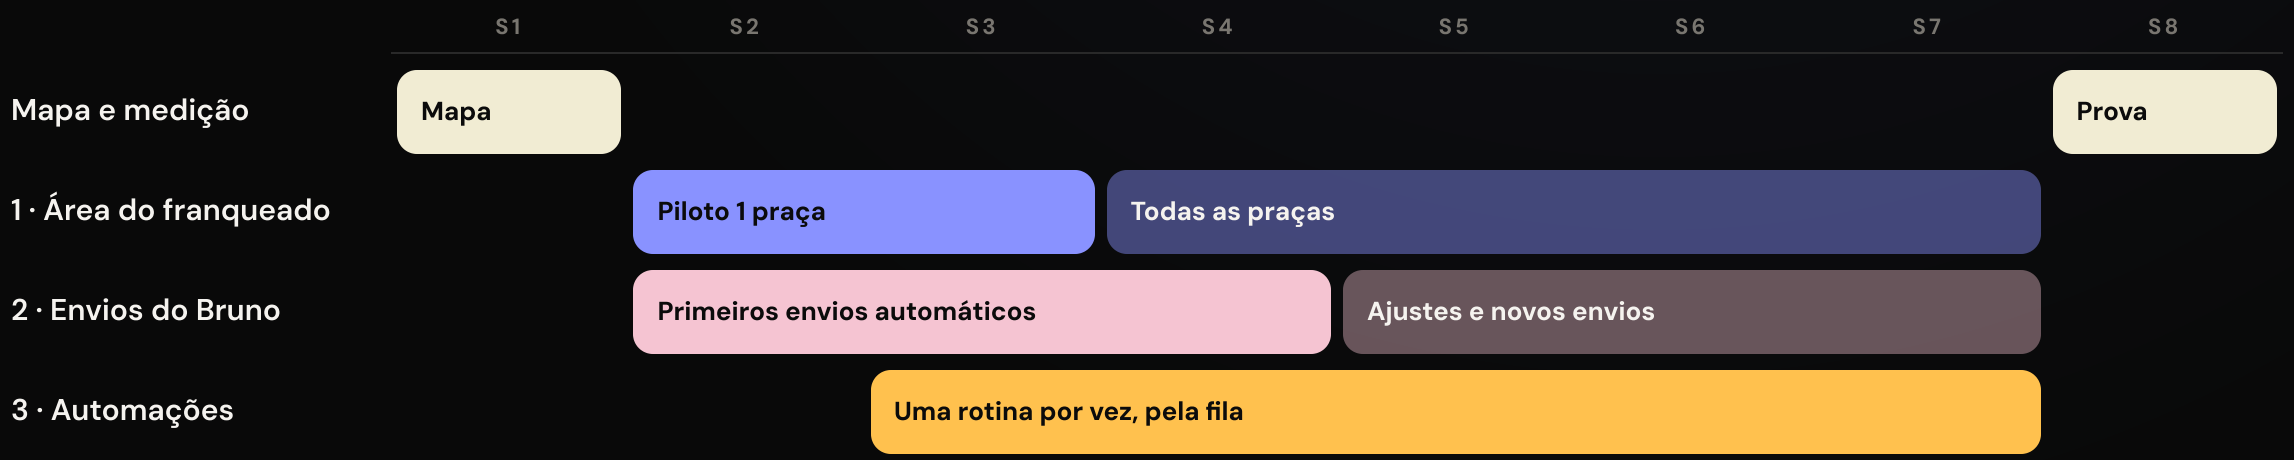

SEMANA 1
Processos, horas e envios mapeados. Ponto de partida medido.

SEMANA 3
Área do franqueado com conteúdo real numa praça piloto.

SEMANA 5
Primeiros envios do Bruno saindo sozinhos.

SEMANA 8
Resultado contra o ponto de partida e decisão sobre a fase seguinte.

COMO EU TRABALHO

Mão na massa, perto do time

RITMO

Entrega toda semana

Uma coisa nova funcionando por semana, mostrada para quem vai usar. Nada de relatório para a gaveta.

COM QUEM JÁ FAZ

Junto do Bruno e de Dados

Aproveito o que a frente de Inteligência & Dados já construiu e trabalho direto com quem sente a dor.

SEM INVENTAR SISTEMA

Reaproveitar primeiro

Notion como fonte, automações nas ferramentas que vocês já pagam. Construir só o que não existe.

FICA PARA A FASE 2

Previsão de público por artista e cidade, curadoria como produto, matching de agenda e a estratégia de 80 para 160 eventos. Tudo isso fica melhor com a máquina rodando e dado real acumulado.

PARA COMEÇAR

O que eu preciso para a semana 1

ACESSO

Notion, planilhas e ferramentas, para ler como tudo funciona hoje.

BRUNO

Uma conversa para mapear todos os envios que ele faz.

PRAÇA PILOTO

Uma praça e um franqueado para testar a área primeiro.

FORMATO

Combinarmos dedicação e acompanhamento entre nós.

Tudo aqui é um esboço feito **sem acesso ao Notion**. O desenho final, e a certeza do que dá para automatizar, saem da semana 1 com os dados reais.
